

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [1 DE 6]

Rehabilitación y Modernización del Colector Sanitario El Punto

CONTRATO

Inicio 19 de mayo de 2023

Termino 04 de diciembre de 2023

Monto de contratación \$ 402,031,141.44

Fuente de Recursos PROAGUA 2023 ampliación líquida **Federal 90%**

Contratista MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

Ejecutor Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Longitud del colector **3.04 Km** de Tubería de PEAD de 60" Corrugado.
- **88** Pozos – Caja de visita
- **376** Descargas Domiciliarias

REPORTE FOTOGRÁFICO:



AVANCE FÍSICO GLOBAL:

A la fecha del 11-oct-2023

- Se tienen colocados **322 tramos (1,932 m)** de tubería en cuatro frentes de obra, se continua con la construcción de pozos caja.
- Se trabaja en cimbrado de caja de transición de colector a canal a cielo abierto.
- El avance físico global estimado es del **33%**.

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [2 DE 6]

Rehabilitación y Modernización del Colector Sanitario Zapopan

CONTRATO

Inicio	19 de mayo de 2023
Termino	04 de diciembre de 2023
Monto de contratación	\$ 60,849,866.70
Fuente de Recursos	PROAGUA 2023 ampliación líquida Federal 90%
Contratista	MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.
Ejecutor	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Longitud del colector **1.31 Km** de Tubería de PEAD de 30" corrugado.
- **34** Pozos de visita
- **381** Descargas Domiciliarias

REPORTE FOTOGRÁFICO:



AVANCE FÍSICO GLOBAL:

Avance al 11-oct-2023.

- Se han colocado 52 tramos (**312 m**) de tubería PEAD Ø 30"
- Se ha colocado 242 metros de reposición de pavimento hidráulico.
- El avance físico global estimado es del **23%**.

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [3 DE 6]

Rehabilitación de Planta de Tratamiento “El Punto” 3ra. Etapa

CONTRATO

Inicio 19 de mayo de 2023

Termino 04 de diciembre de 2023

Monto de contratación \$ 60,327,392.70

Fuente de Recursos PROAGUA 2023 ampliación líquida **Federal 90%**

Contratista MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

Ejecutor Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit



DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Se contempla la rehabilitación de Planta de Tratamiento con capacidad de 750 LPS tipo filtros percoladores, **se rehabilitará un tren de tratamiento de 250 l/s.**

REPORTE FOTOGRÁFICO:



AVANCE FÍSICO GLOBAL:

Avance al 11-oct-2023:

- Se continua con el desmantelamiento de filtros percoladores del tren No. 3.
- Se concluye el retiro de azolve y desmantelamiento de estructura metálica en sedimentador primario del tren No. 3.
- Se limpió y resanó el sedimentador secundario 2 y 3.
- El avance físico global estimado es del **16.38%**.

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [4 DE 6]

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ciudad Industrial

CONTRATO

Inicio 19 de mayo de 2023

Termino 04 de diciembre de 2023

Monto de contratación \$ 27,881,839.20

Fuente de Recursos PROAGUA 2023 ampliación líquida **Federal 90%**

Contratista MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.

Ejecutor Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit



DATOS GENERALES DE LA OBRA:

- Se contempla la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de **2 lps** tipo lodos activados.

REPORTE FOTOGRÁFICO:



AVANCE FÍSICO GLOBAL:

Al 11-oct-2023:

- Se concluye construcción del desarenador.
- Se aplica impermeabilizante integral al desarenador.
- Se inicia el habilitado de cinchos metálicos para los reactores existentes.
- Se tiene un avance físico global estimado del **21%**.

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [5 DE 6]

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente


DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONTRATO

Inicio	19 de mayo de 2023
Termino	04 de diciembre de 2023
Monto de contratación	\$ 98,811,364.62
Fuente de Recursos	PROAGUA 2023 ampliación líquida Federal 90%
Contratista	MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.
Ejecutor	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

- Se contempla la rehabilitación de Planta de Tratamiento con capacidad de **250 LPS** tipo discos biológicos.

REPORTE FOTOGRÁFICO:

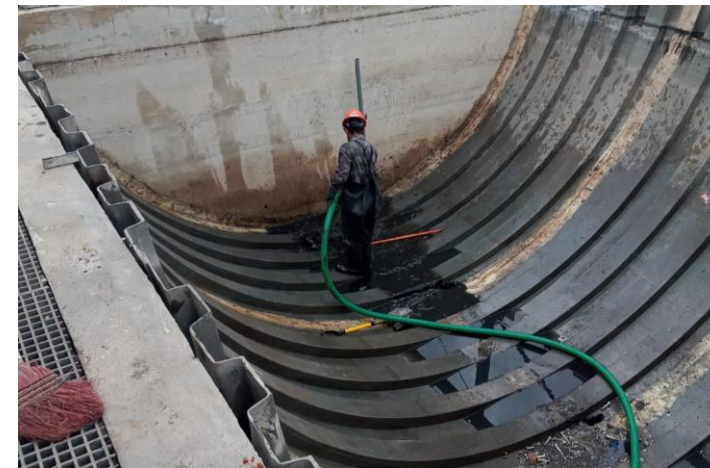

AVANCE FÍSICO GLOBAL:

Avance al 11-oct-2023:

- Se continua con los trabajos de retiro de rejilla perimetral y faldón.
- Se continua con el retiro de medias cañas de los biodiscos.
- Se continua con el retiro de agua en los módulos de biodiscos con bomba sumergible.
- El avance físico global estimado es del 16%.

SANEAMIENTO RÍO MOLOLOA EN LA CUENCA DEL RIO MOLOLOA [6 DE 6]

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Xalisco

CONTRATO

Inicio	19 de mayo de 2023
Termino	04 de diciembre de 2023
Monto de contratación	\$ 74,193,510.78
Fuente de Recursos	PROAGUA 2023 ampliación líquida Federal 90%
Contratista	MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I. DE C.V.
Ejecutor	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit

DATOS GENERALES

- Se contempla la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de **30 lps** tipo lodos activados.



AVANCE FÍSICO

Avance al 11-oct-2023:

- Se realiza el colado del módulo de lodos activados del sedimentador No. 2.
- Se continua la construcción de cimentación a base de mampostería de piedra en instalaciones del edificio administrativo.
- Preparación de cimbra para colado de losa en cárcamo general.
- El avance físico global estimado es del **28%**.

REPORTE FOTOGRÁFICO:

